

DERINU:
Mažeikių savivaldybės merė
R. Matulaitienė
2023 m. 09 - 05

TVIRTINU:
Generalinis direktorius
A. Čekanauskas
2023 m. 09 05

**UAB „MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ MAŽEIKIŲ KATILINĖS
TIEKIAMO IR GRĄŽINAMO ŠILUMINĖŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS
2023/2024 m. APŠILDYMO SEZONUI**

$T_v \text{ paraišų} = 18^\circ\text{C}$

Leidiniai vidutiniai paros nukrypimai +/- 5%

Paduodamo termofikacinio vandens slėgis – 6,2 bar.

Grįžtamo termofikacinio vandens slėgis – 3,0 bar.


Skaičiuotinas šilumnešio kiekis $G \sim 962 \text{ m}^3/\text{h}$

Nešildymo periodo metu šilumos tiekimas vykdomas tokiu grafiku:

Paduodamas slėgis 5,3 bar., temperatūra 65 $^\circ\text{C}$;

Grįžtamas slėgis 4,1 bar., temperatūra ne daugiau 41 $^\circ\text{C}$.

Vidutinė paros lauko temperatūra $^\circ\text{C}$	Termofikacinio vandens temperatūra	
	Paduodama $^\circ\text{C}$	Grįžtama $^\circ\text{C}$
10	65,0	41,0
9	66,0	41,0
8	67,0	42,0
7	68,0	43,0
6	69,0	43,0
5	70,0	43,0
4	72,0	43,0
3	74,0	44,0
2	75,0	44,0
1	76,0	44,0
0	77,0	45,0
-1	78,0	46,0
-2	79,0	46,0
-3	80,0	46,0
-4	81,0	46,0
-5	82,0	46,0
-6	83,0	46,0
-7	85,0	47,0
-8	87,0	47,0
-9	88,0	47,0
-10	90,0	47,0
-11	91,0	48,0
-12	92,0	48,0
-13	93,0	48,0
-14	94,0	49,0
-15	95,0	49,0
-16	96,0	49,0
-17	97,0	50,0
-18	97,0	50,0
-19	98,0	50,9
-20	99,0	51,0
-21	99,7	51,0

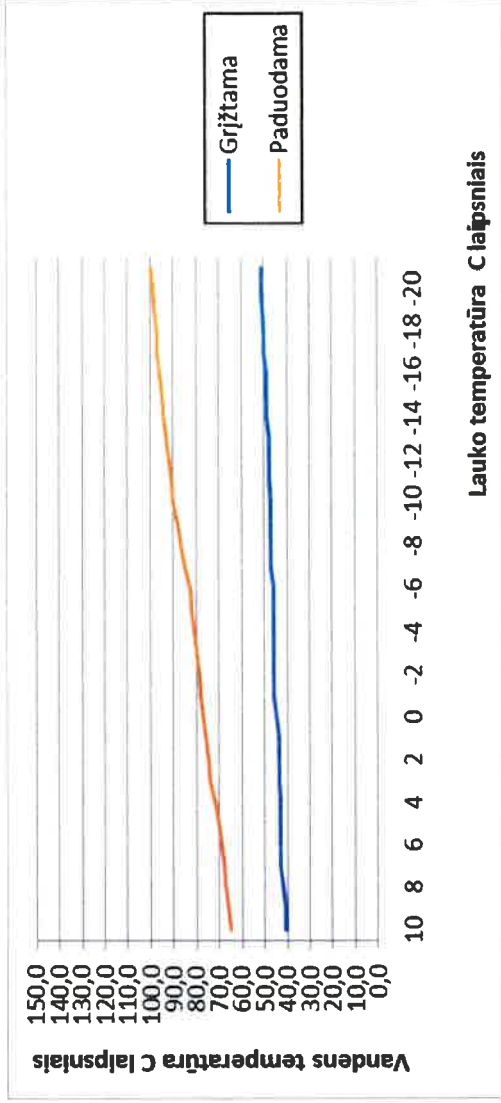

SUDERINTA:
Technikos direktorius
I. Klasauskas
2023 m. 09 05

Vietinio ūkio skyriaus
vntausis specialistas
Stasys Brazas
2023-09-05

Ruošė:
GTT vedovas
S. Šlyžius
2023 m. 09 05

SUDERINTA
Mažeikių rajono savivaldybės merė
Rūta Matulaitienė
2023 m. 09 mėn. 05 d.
